


【工事新聞】

第2号
2023.07

7月度定点写真

7月は何の工事をしてるの？

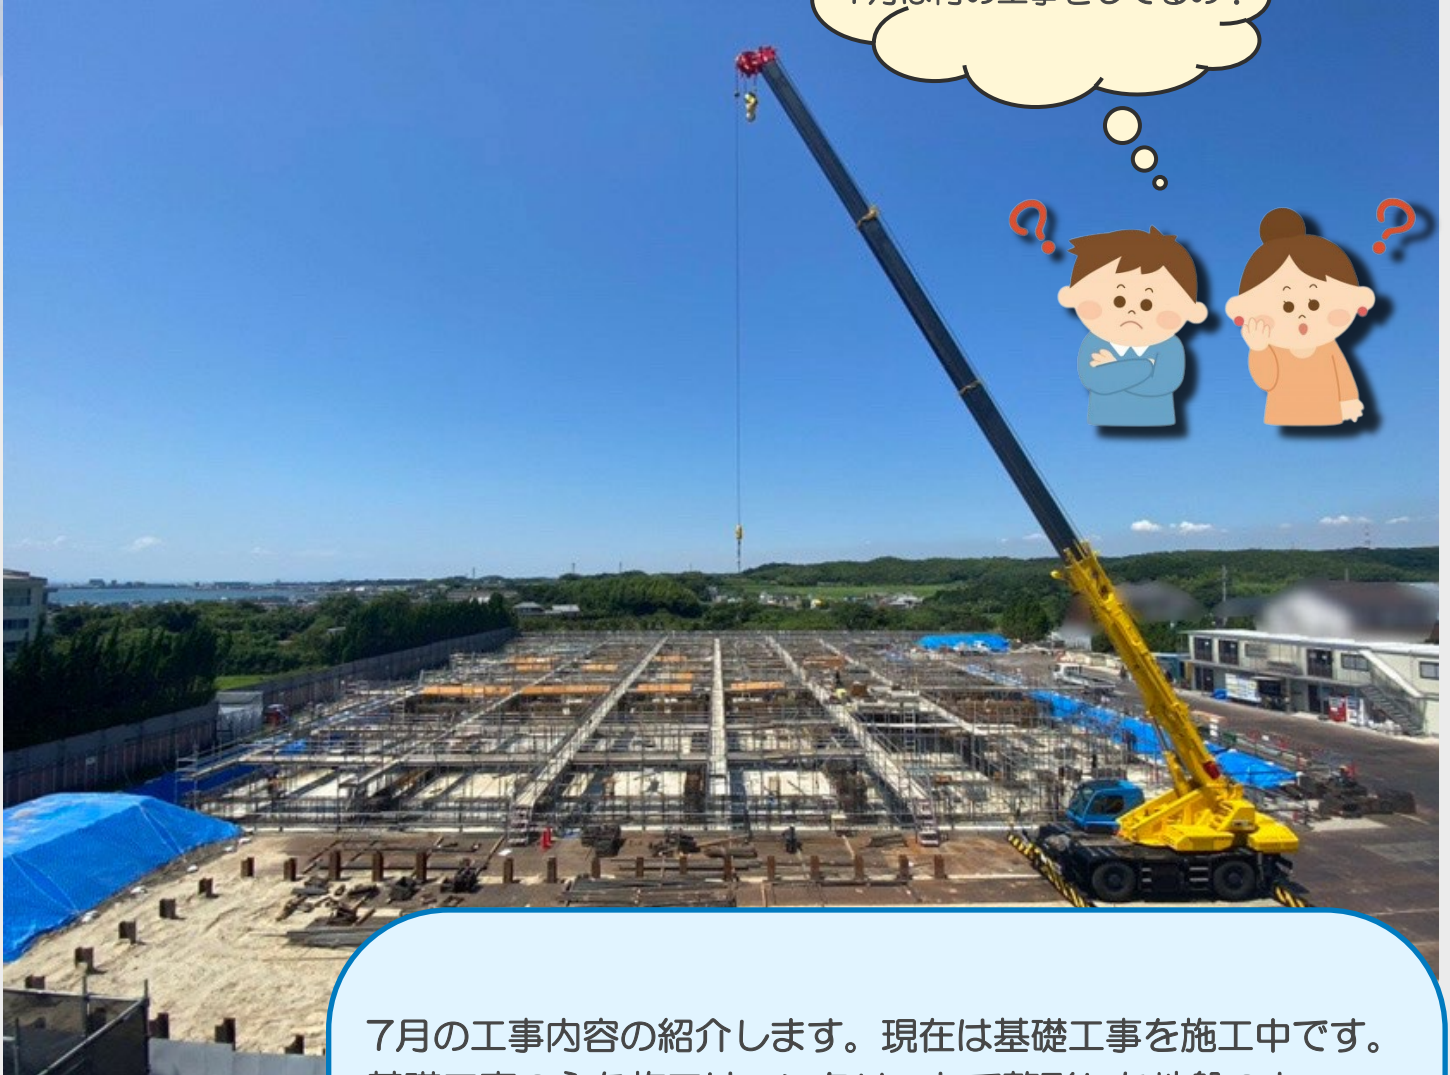


7月の工事内容の紹介します。現在は基礎工事を施工中です。基礎工事の主な施工はコンクリートで整形した地盤の上に鉄筋及び型枠の施工を行い、コンクリート打設をし基礎を整形していきます。

鉄筋工事は、建物の主要なコンクリート構造物の工事で鋼材を組立てて納めていきます。組立てた鉄筋をガス圧接器という機械を使用しガスであぶり玉の形にして鉄筋構造をつなぎ合わせていきます。鉄筋完了後に型枠工事の施工に入りコンクリートを流して硬化したら基礎完了です。



7月はこんなことをしたよ!!

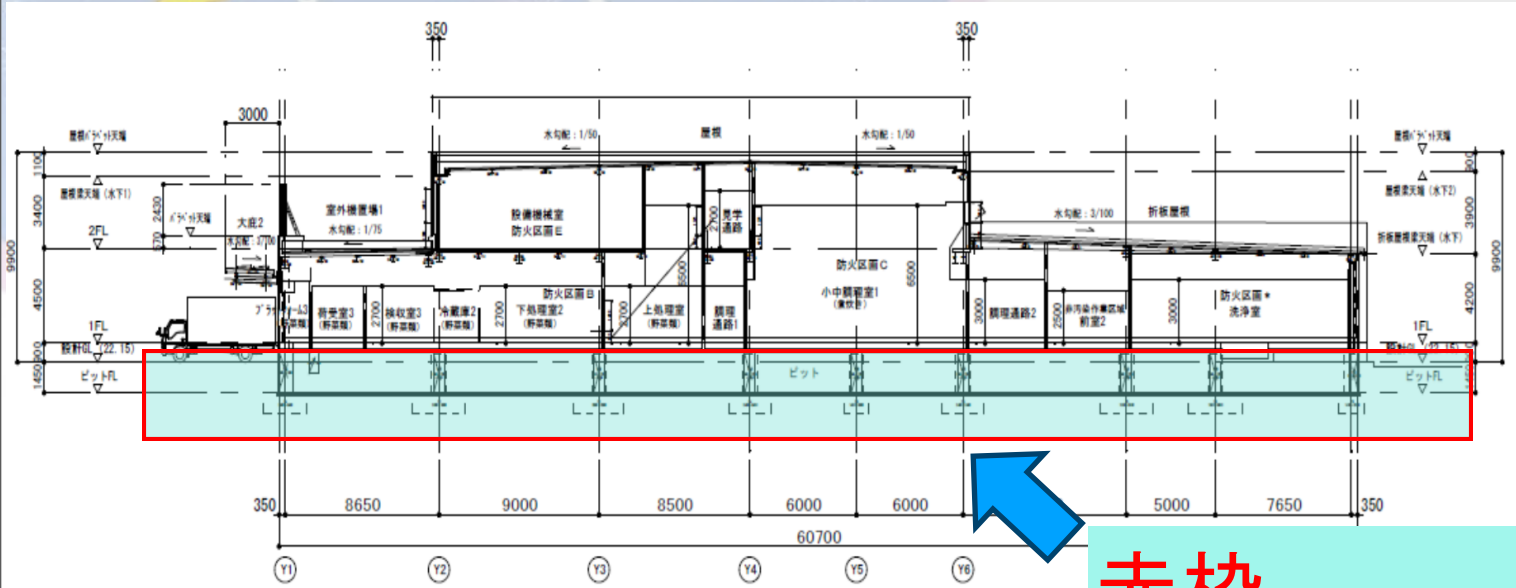

赤枠の範囲を工事中

① 共同調理場棟 ベースパック工事

建物の柱を取付ける
架台だよ!



工事名	常津市新学校給食共同調理場増築事業建設工事
工種	鉄骨工事
種別	ベースパック 位置 B1区
施工状況	
施工者	徳倉 水野特定建設工事共同企業体
	2023/06/28

② 共同調理場棟 鉄筋工事



工事名	常津市新学校給食共同調理場増築事業建設工事
工種	鉄筋工事
種別	施工状況 位置 C1区
施工状況	
施工者	徳倉 水野特定建設工事共同企業体
	2023/07/14

③ 共同調理場棟 鉄筋圧接状況

こんな玉になるよ!



工種	圧接工事
種別	
圧接施工状況	D25+D25 フライングー掛け状況
二次圧接	〇
圧接完了	
施工者	徳倉 水野特定建設工事共同企業体
	2023/07/08

④ 基礎コンクリート1回目打設状況



工事名	常津市新学校給食共同調理場増築事業建設工事
工種	コンクリート工事
種別	基礎 位置 A1区
基礎コンクリート打設状況	
施工者	徳倉 水野特定建設工事共同企業体
	2023/07/24

バイブレーターという
機械で打設してい
よ!

◎ 工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願い致します。◎
