

第10号

2024.03

常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事

工事新聞

3月度定点写真




3月の工事内容を紹介します。本体の共同調理場棟の内部は引き続き1F.2F設備・電気工事及び内装工事、外部の主な作業は外壁塗装工事、防水工事、タイル工事の施工を行っています。コンクリート打設工事も完了しました。多数ある厨房ピット内のモルタルの左官工事も合わせて行っています！この1か月で工事が随分と進みました。職人さんの人数も100名を超える日もあり、現場の繁忙期をむかえています。安全第一で工事を進めていきます。4月はクロスや床工事、塗床、外構工事を紹介します。



3月の現場作業内容



ウレタン塗膜防水

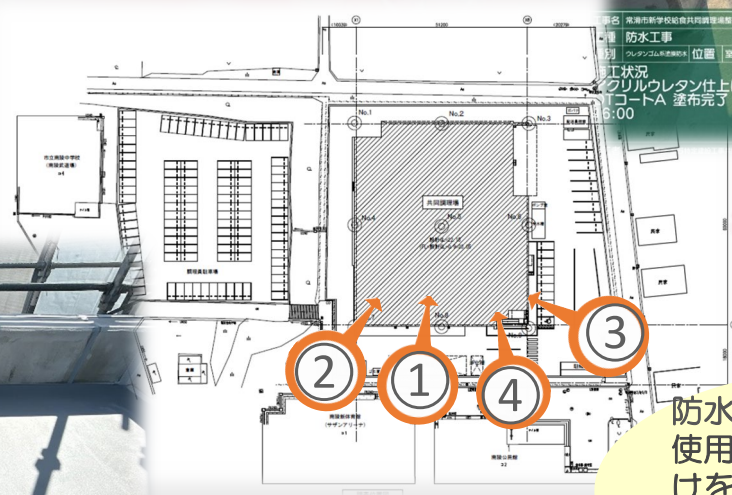

防水工事は使用用途や使用する場所によって使い分けをします！
この現場では、6種類の防水工法に分かれています。



シート防水

工事名 常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事
種別 浄化槽・排水処理槽工事
種別 防水工事 位置 排水処理槽構築
施工状況 繊維分子ルーフィングシート防水工法
施工状況 水切ルーフィング工法
施工状況 水切ルーフィング工法
施工状況 水切ルーフィング工法
施工状況 水切ルーフィング工法

① 金属製建具工事

② 防水工事（アスファルト防水）@ 室外機置場



合成繊維不織布のシートに、液状に溶かしたアスファルトを染み込ませコーティングした、ルーフィングシート（建物内に水滴を入れないシート）を二層以上に仕上げることによって、防水機能をより強固にする工法です。

④ タイル工事

工事名 常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事
種別 防水工事
種別 アスファルト防水 位置
施工状況 強力アドバン張り付け
施工状況 厚み100mm以上



アルミドアやスチールドアの枠を溶接していくよ！

③ 塗装工事（外壁塗装）

ALC面の外壁塗装は6工程あるよ！



工事名 常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事
種別 タイル工事
種別 ALC面弾性接着剤張り工法
施工状況 タイル張り付け



◎ 工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願い致します。◎
